

福井市足羽ポンプ場建設工事 現在の進捗

令和7年3月25日現在

現在施工中の工種

基礎杭工


写真①




写真②



平面図

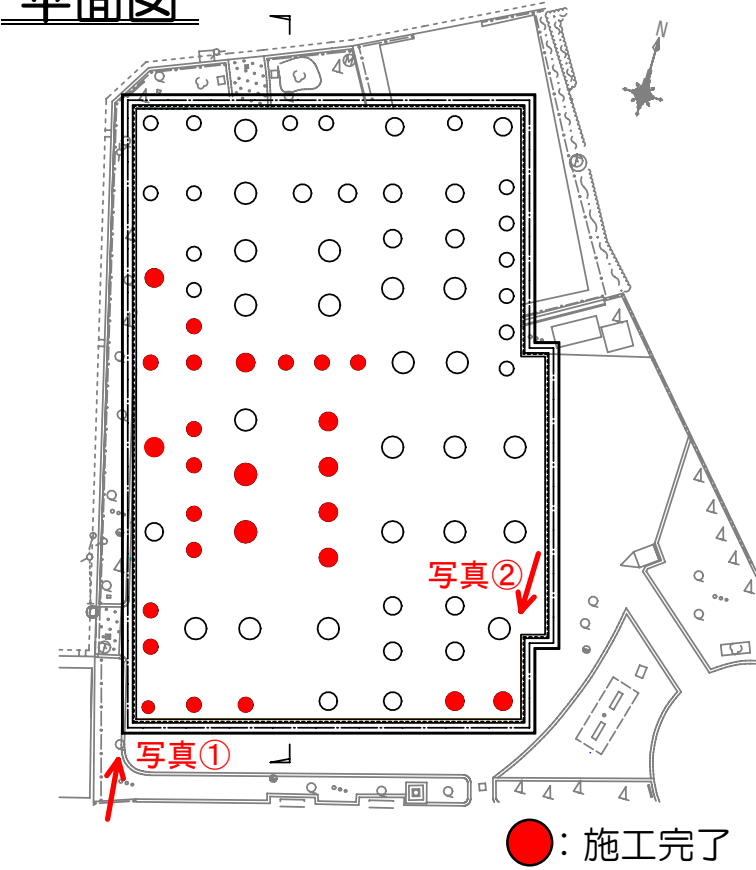

断面図

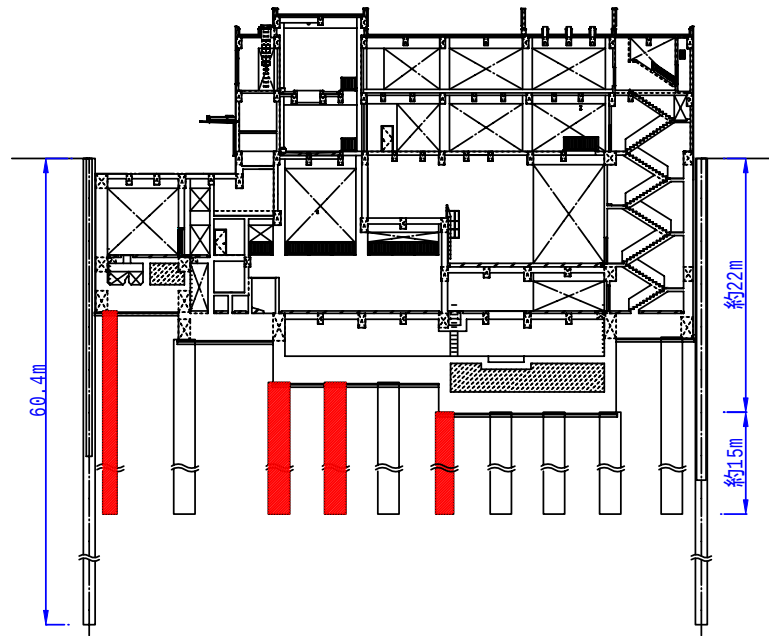

工事フロー

工事フロー	予定時期	進捗
植栽・遊具撤去工	R6.9月 ～R6.10月	100%
基礎杭工	R7.1月 ～R7.5月	34%
仮設杭工	R7.5月 ～R7.6月	
地中連続壁工	R7.6月 ～R7.11月	
掘削工	R7.12月 ～R8.5月	
地下部分構築工	R8.6月 ～R9.5月	
地上部分構築工	R9.5月 ～R9.9月	
内装・外壁工	R9.9月 ～R10.2月	
